

## 동해선 하부 유희부지 체육 공간화(변경)

[illegible]

○ 세부 추진계획

- (2024년) 9. ~ 11. : 동해선 하부 유희부지 체육공간화 사업 공사 착공 및 준공
- (2025년) 1. ~ 6. : 지속 운영(사후 관리)

5. 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	총사업비	기투자	계	2022년(하)	2023년	2024년	2025년
총계	계	220	-	220	-	20	200	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-
	시비	200	-	200	-	-	200	-
	구비	20	-	20	-	20	-	-
	기타(재원명)	-	-	-	-	-	-	-
야외운동기구 추가 설치	소계	20	-	20	-	20	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-
	구비	20	-	20	-	20	-	-
	기타(재원명)	-	-	-	-	-	-	-
동해선 하부 유희부지 체육공간화	소계	200	-	200	-	-	200	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-
	시비	200	-	200	-	-	200	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-
	기타(재원명)	-	-	-	-	-	-	-

○ 재원 조달 방안: 市 공공용지 활용 생활체육시설 확충지원사업 선정

☞ 시비 2억원 확보(市체육진흥과)

6. 공약달성 확인지표

세부 추진 사항	목표	단위	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
야외운동기구 추가 설치	1	식		1			
부지 사용 협의	1	식			1		
동해선 유희부지 체육공간화 사업 (게이트볼장 2면 조성)	1	식			1		

7. 주민참여 및 소통계획

○ 사업 완료에 따른 언론 보도 : 1회

(단위 : 회)

계	설명회·공청회 등	설문조사	전문가 자문	언론보도	기 타
1	-	-	-	1	-

## 8. 그간 추진사항

구 분	내 용	비 고
23년 상반기	○ 2023. 6. : 그린라인파크 내 운동기구 추가 설치 완료	
24년 상반기	○ 2024. 4. : 공공용지 활용 생활체육시설 확충사업 선정 시비 2억원 확보 ○ 2024. 5. : 공약사항 이행 변경 검토 완료 및 실시설계용역 착수 ○ 2024. 6. : 실시설계용역 중간보고회 개최 ○ 2024. 8. : 실시설계용역완료 ○ 2024. 9. : 공사 착공	


## 9. 문제점 및 대책

○ 해당없음


## 10. 기대효과

○ 생활체육에 대한 구민의 욕구 충족 및 구민의 건강 증진과 삶의 질 향상에 기여

## 11. 관련사진

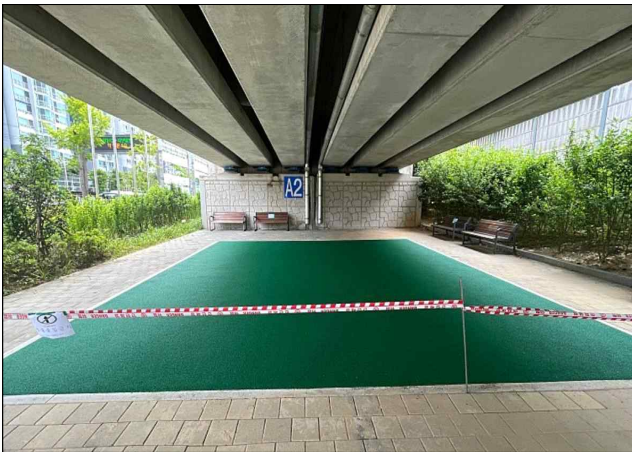

▲ 현장사진(포장 작업 후)

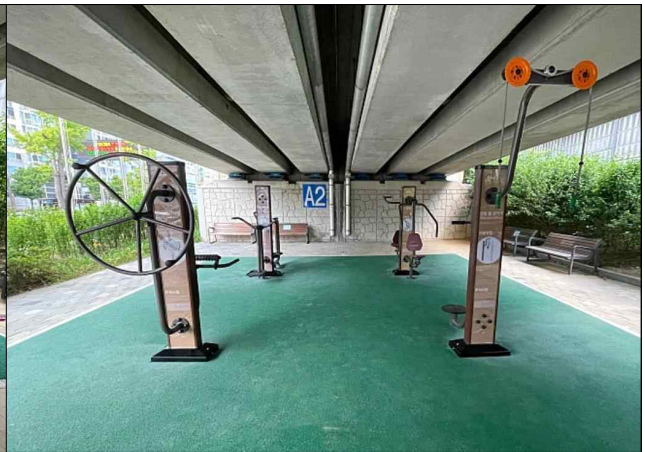

▲ 현장사진(운동기구 설치 후)
